

諏訪湖周クリーンセンター建設

eco ポツポ通信



◆造成工事竣工！

平成25年12月より敷地造成工事を行ってきましたが、1月27日に竣工検査を実施し、無事引き渡しを完了しました。

造成基本設計図

植生ブロック施工箇所

植生ブロック完成

着工前

完成

平地面積：約9,500㎡⇒約14,000㎡(約1.5倍)

補強土壁施工箇所

補強土壁完成

補強土壁構造模型図

竣工検査状況

◆工事完了のお礼

この度は、諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事へのご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございました。

1年間という長いようで短い期間でしたが、私どもがこの工事を通じてまた一步成長できたと感じております。そして、少しでも皆様の生活に欠かす事のできない施設工事に携われたことを誇りに感じつつ、お礼の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。

諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事株式会社 岡谷組



現場代理人：村上 徹



現場員：有賀 和弥

■鉄骨の建方を開始しました！！

ごみピットから投入されたごみを焼却処理する、施設の中心を成す炉室部分は、地下の鉄筋コンクリート工事を終え、いよいよ地上の鉄骨建方を開始しました。

今回の鉄骨建方範囲は、排ガス処理設備や煙突等を支える部分になるもので、重量はおよそ100トン、高さ10m(地上3階)までの作業を完了しました。

今後、エリアごとに5回に分けて建方を行い、全体では1200トンの鉄骨を使用いたします。

また、ごみピット部分は引き続き掘削工事を行っており、現在地下およそ11mまでの掘削が完了しました。

掘削は2月中に完了し、その後ごみピットとなる地下のコンクリート躯体工事を開始する予定です。




鉄骨搬入状況



建方状況




ごみピット掘削状況

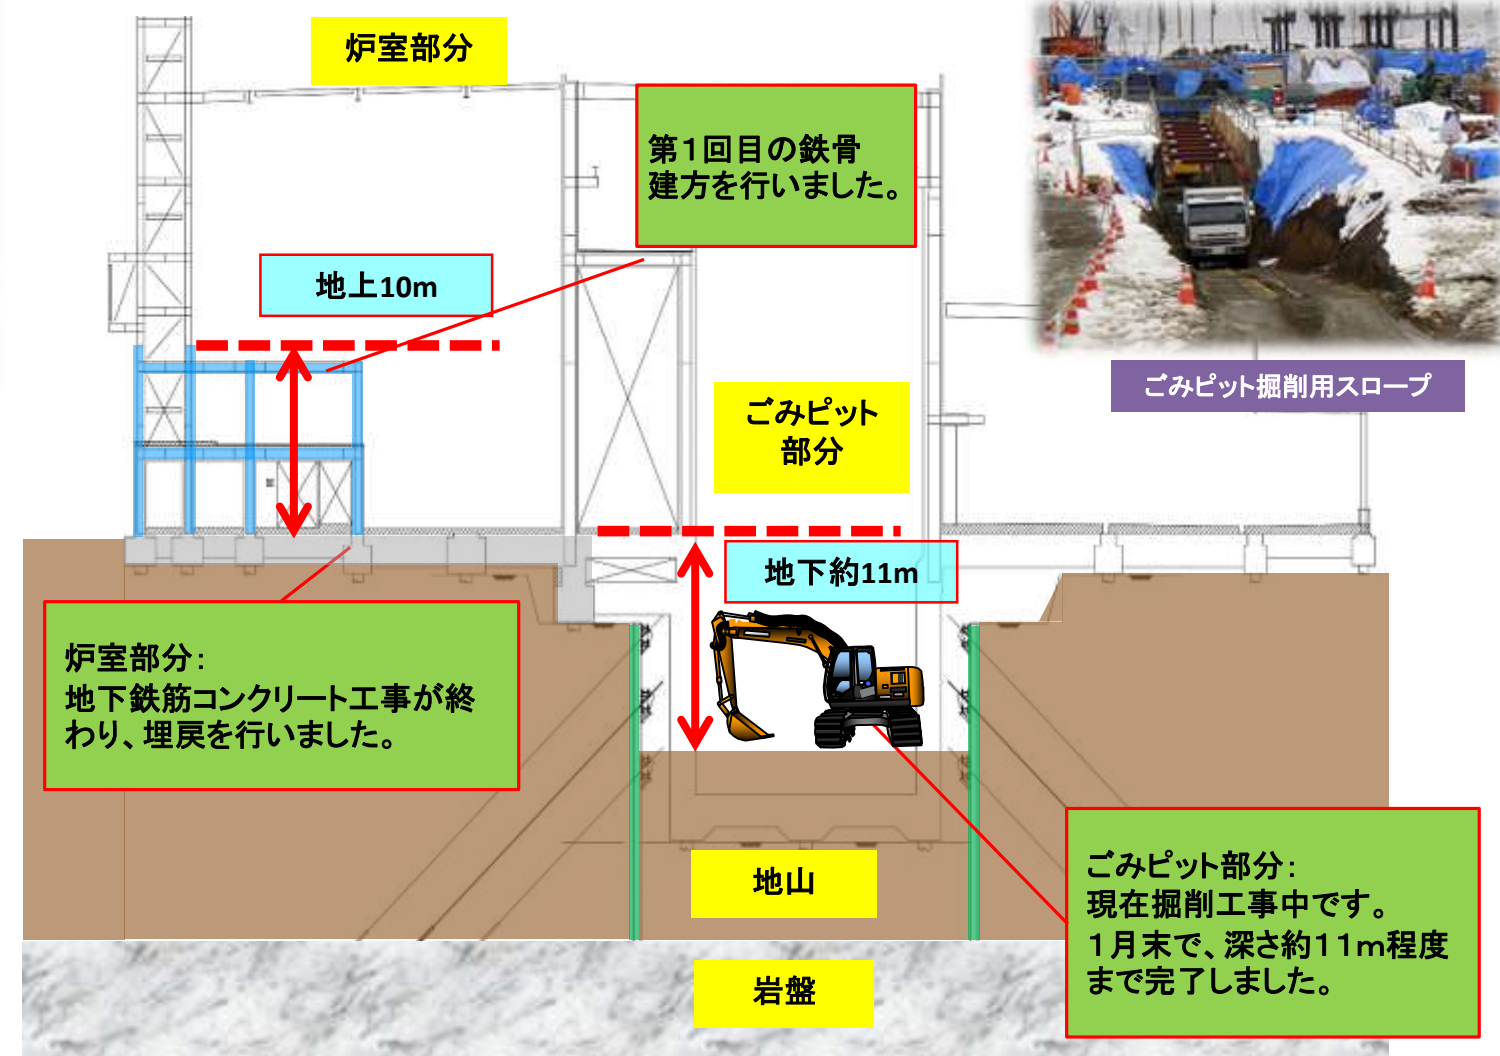

■工事進捗状況

●諏訪湖周クリーンセンター整備工事

- A工区基礎のコンクリートを打設し、埋戻を行いました。
- 鉄骨は工場で製品検査を行ったあと、現場に搬入し、第1節の建方を行いました。
- ごみピット部分の掘削工事を進めています。
- 今冬は降雪が多く、除雪のためたびたび作業がとまっています。
工事場所に降った雪は人力・クレーン車で建物外に出すしかなく、頭の痛い問題です。

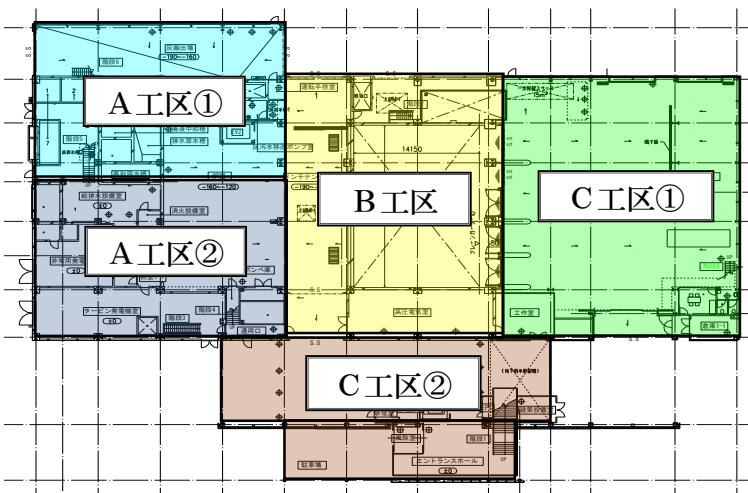

工区位置図



A工区② 基礎コンクリート打設状況



A工区② 埋戻状況



鉄骨検査状況(工場検査)



除雪状況



鉄骨建方状況

■今後の予定

●●●2月の工事予定●●●

- 炉室部分は、地上1階の鉄筋コンクリート躯体工事(鉄骨鉄筋コンクリート構造部分)
- ごみピット部分は掘削工事の後、地下コンクリート躯体工事



地下コンクリート躯体工事(イメージ)

■敷地全体状況

12月下旬時点



1月下旬時点



発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会

タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体 連絡先: 78-7143

株式会社岡谷組 連絡先: 23-7285

湖周行政事務組合 連絡先: 23-4811(内線1443・1444)
