

諏訪湖周クリーンセンター建設

eco ポツポ通信

ごみピットの深さを体感してみませんか？

＜諏訪湖周クリーンセンター第3回工事現場見学会を開催します＞

工事の現場状況説明や間近でごみピット工事の状況が見学できます。また、稼動している建設機械のデモンストレーション、体験乗車及び記念撮影ができますので、是非、ご家族揃って直接会場までお出かけください。事前の申込は不要です。

日時：4月11日（土）午前10時開始（1時間程度）

会場：やまびこ公園横の諏訪湖周クリーンセンター工事現場
（駐車場は、やまびこ公園第2、第3駐車場をご利用ください）

内容：・工事現場状況の説明及び見学
・建設機械の試乗及び撮影会（当日プリントして配布します）

※当日は、工事現場内での見学になりますので、汚れても良い服装でご参加ください。なお、小雨程度であれば、予定通り開催しますが、状況次第で中止となることもあります。

参加費
無料

お子様に記念品
プレゼント！！




普段乗ることのできない建設機械に乗って記念写真が撮れるよ！！



前回の見学会の様子



炉室1階 鉄筋・型枠工事状況

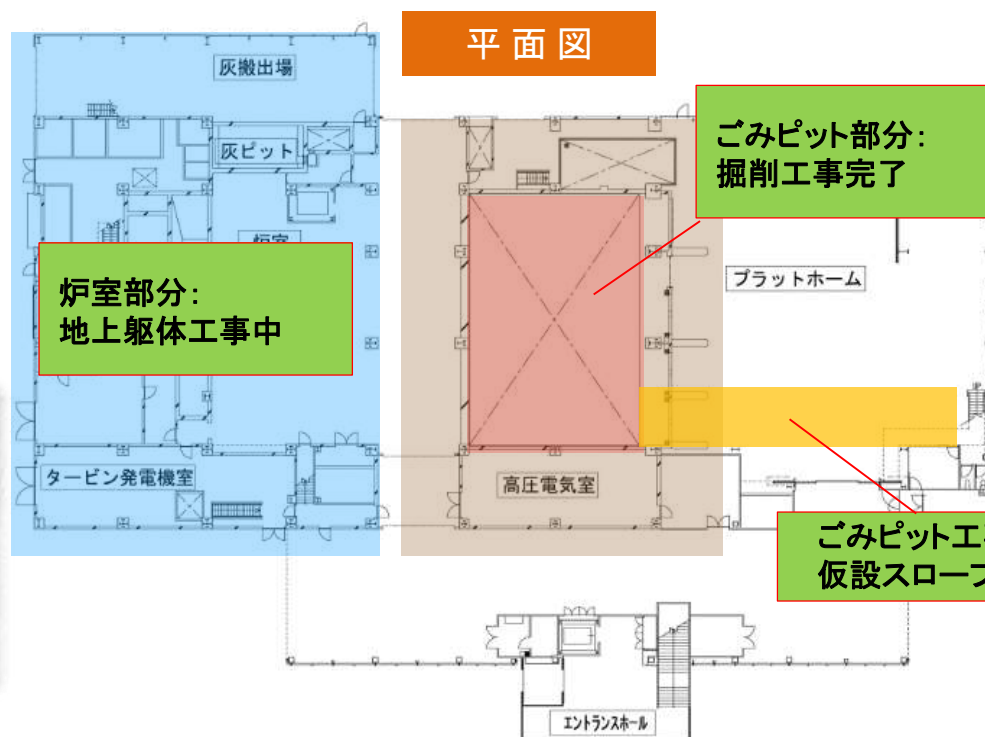

炉室2階床 完成

■ごみピットの掘削完了！！

3月27日に、ごみピット部分の掘削工事を完了しました。掘削した穴の深さは、地下約20m（地上5階建てのビルと同程度の深さ）で、総計10,000㎡の掘削を行いました。今後は鉄筋コンクリート造のごみピットを構築していく躯体工事に工程が移ります。

また、炉室エリアでは、第2段階の鉄骨建方を行い、建物高さは16mに達しました。コンクリート工事も進んでおり、2階床のコンクリートを3月20日に打設しました。

今後は3階、4階の床工事を進めていき、4月下旬からはよいよプラント工事に着工いたします。プラント工事は、まず工事用クレーンの組み立てを行ったあと、1階のコンベヤ据付から開始する予定です。


※冬季の雪の影響等で、当初工程から約1ヶ月程の遅れが生じておりますが、今後の作業において挽回できるものと考えており、現時点では、平成28年8月末の完成予定に変更はありません。



鉄骨建方状況




↓先月の掘削深さ

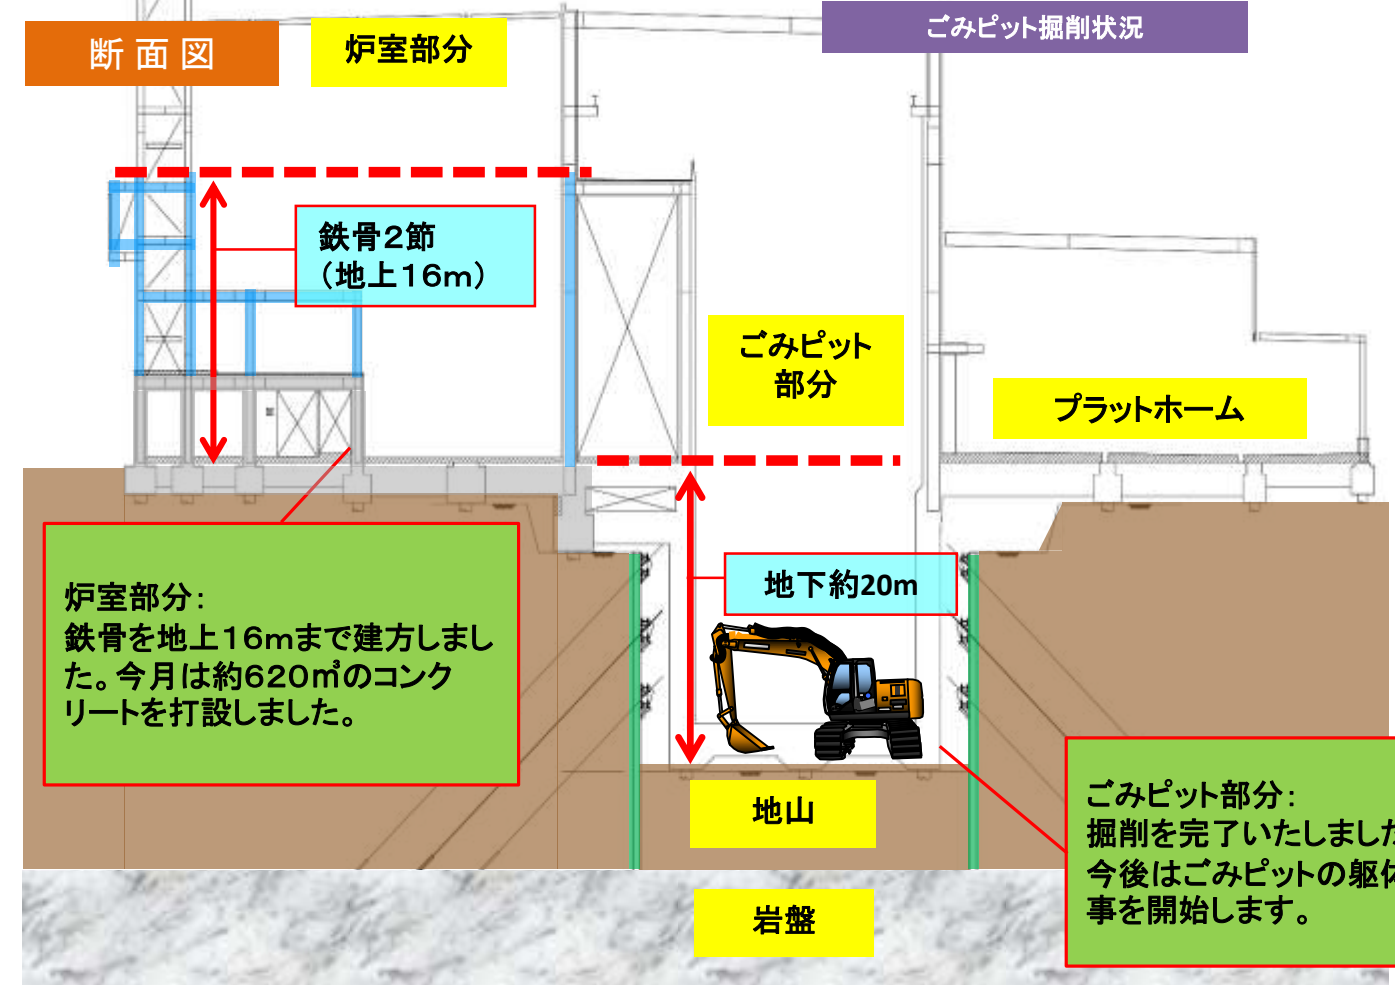

■工事進捗状況

工区	内容
A工区①	1階から2階のコンクリート工事(壁、柱、床等)、第2段階の鉄骨建方工事
A工区②	同上
B工区	ごみピット部の掘削・山留工事、完了後に底面への砕石敷および均しコンクリート打設
C工区①	B工区の進捗後に着手予定
C工区②	同上

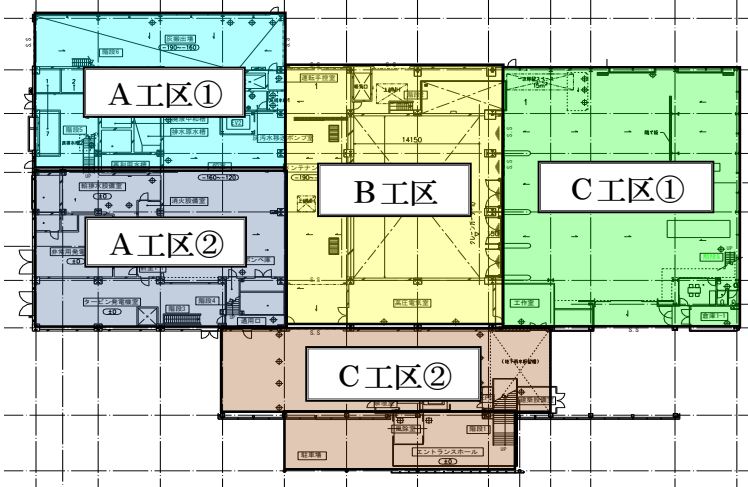

工区位置図



工事用クレーン 2号機完成(120t吊)



A工区①② 鉄骨第2段階建方状況



A工区①②2階コンクリート打設状況



3月に入っても4回雪が降りました。



A工区 確認機関による中間検査受検状況

■今後の予定

●●●4月の工事予定●●●

○建築工事

- ・A工区①、②(炉室部分)は、地上3～4階のコンクリート床工事、各所機械基礎工事
- ・B工区(ごみピット部分)は地下コンクリート躯体工事

○プラント工事

- ・下旬から重機組み立て、1階コンベヤ据付工事



プラント機器据付工事(イメージ)

■敷地全体状況

2月下旬時点



3月下旬時点



発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会
 タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体 連絡先:78-7143
 株式会社岡谷組 連絡先:75-2679
 湖周行政事務組合(岡谷市役所内) 連絡先:23-4811(内線1443・1444)
