


諏訪湖周クリーンセンター建設

eco ポツポ通信

■既設基礎杭撤去工事に着手しました


基礎杭撤去位置図

※今回の工事で全250本中96本撤去します。

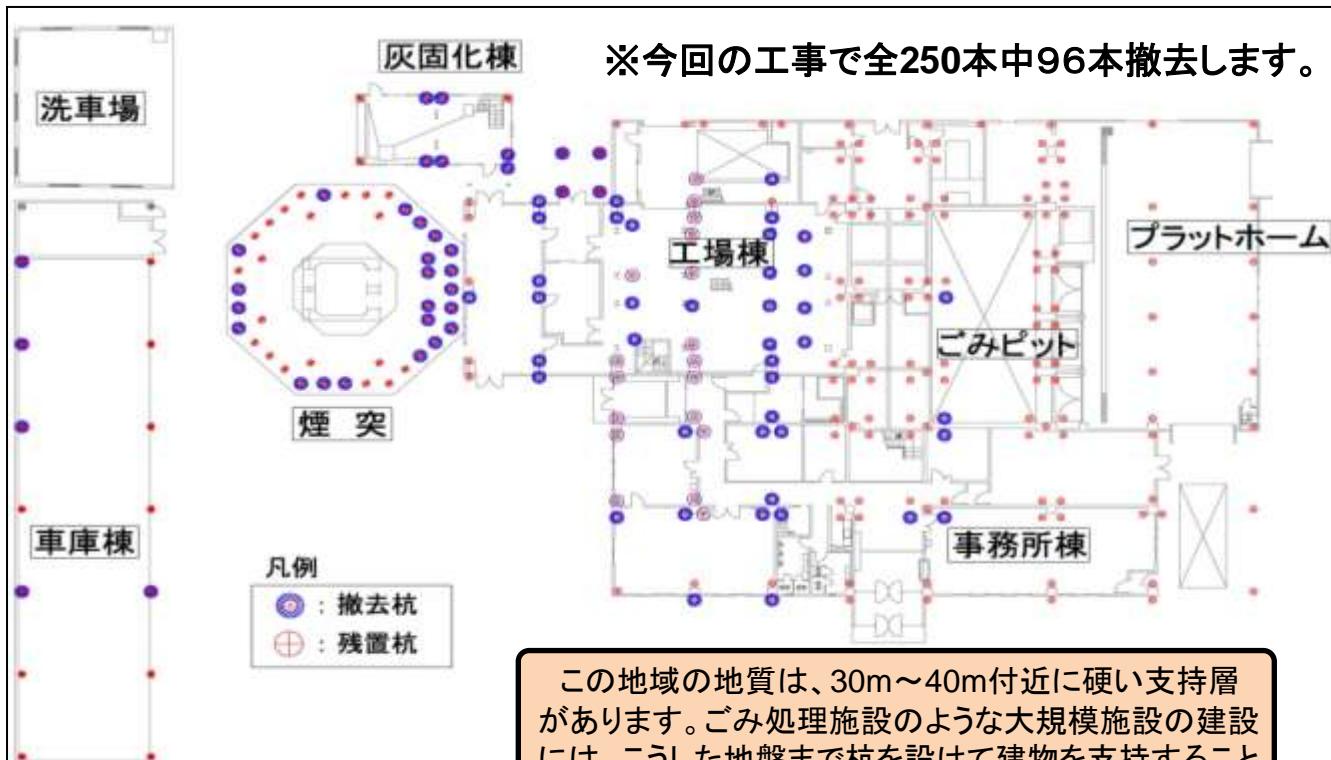

この地域の地質は、30m～40m付近に硬い支持層があります。ごみ処理施設のような大規模施設の建設には、こうした地盤まで杭を設けて建物を支持することが必要であります。旧工場棟下部にもその杭が存在しておりましたが、新施設建設に当たっても同様に新たな杭の設置が必要となり、その設置に影響する旧工場棟の杭を撤去します。

基礎杭撤去順序

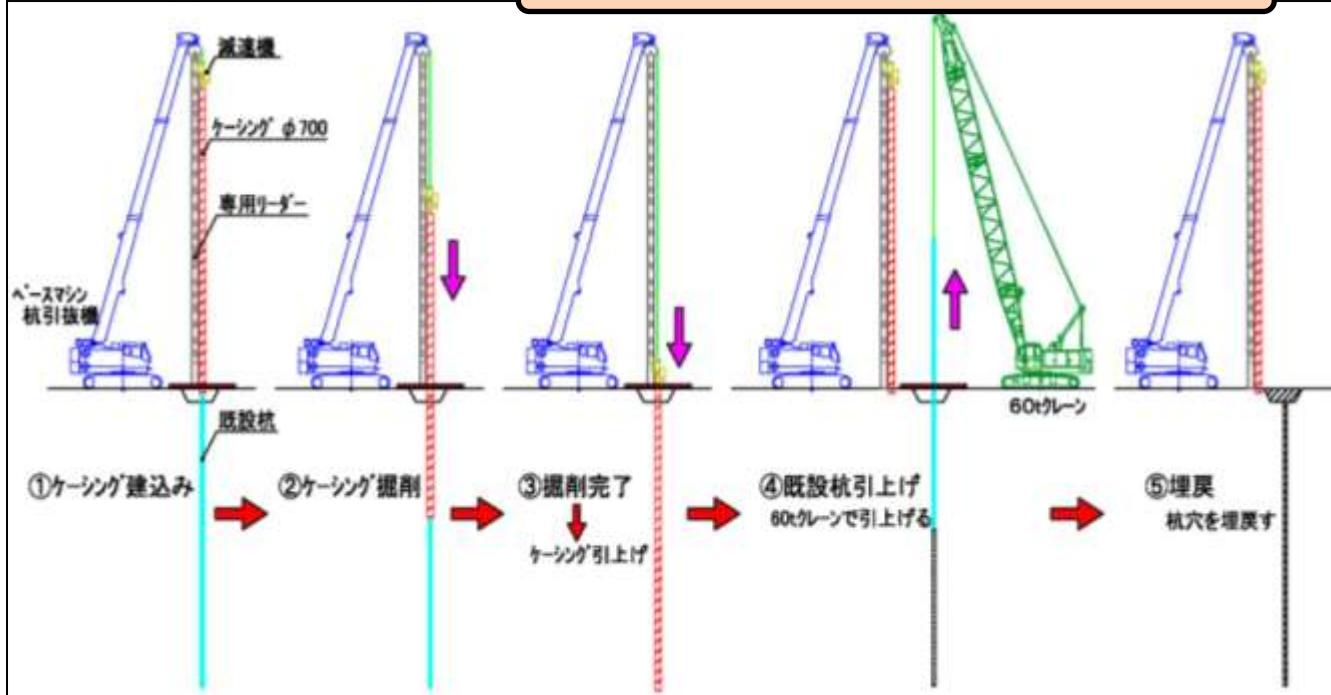

■工事現場見学会を開催しました！

6月14日(土)に、諏訪湖周クリーンセンター第2回工事現場見学会を開催しました。天候にも恵まれ、大勢の皆さんにご参加をいただき、ありがとうございました。

当日は、解体工事及び造成工事の現場見学に加え、工事で使用している建設機械の試乗、撮影会を行いました。お子様には運転席で記念撮影などして楽しんでいただき、盛況のうちに無事終了することができました。



解体工事や造成工事の施工状況について説明しました。



高いところの解体工事に使用した重機を動かしました。この重機は18mの高さまで、届きます。



重機に試乗し写真撮影をしました。



“ポストカード”



撮影した写真は、ポストカードに印刷してプレゼントしました。



いよいよ、9月から諏訪湖周クリーンセンター建設工事に着手いたします。**8月6日(水)**に工事説明会の開催を予定しております。詳細は、次号(第9号)でお知らせします。

■工事進捗状況

①岡谷市清掃工場解体工事

- 工場棟及び煙突解体
工場棟や煙突の地下部にある基礎の解体工事が終了しました。
- 基礎杭撤去
基礎杭撤去のための仮設道路掘削工事を行いました。



建屋基礎解体作業施工状況



煙突基礎解体作業施工状況



建屋・煙突基礎解体作業完了



仮設道路掘削後の状況

②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事

- 盛土工
現場内発生土を流用し、改良材(石灰)を混合し盛土を行っています。



改良材混合状況



盛土工施工状況

③諏訪湖周クリーンセンター建設工事

現在、諏訪湖周クリーンセンター建設に向けて、設計協議を重ねてきましたが、実施設計が固まり、建築確認申請図書を提出しました。

■今後の予定

●●●7月の工事予定●●●

- ①岡谷市清掃工場解体工事
 - 既設基礎杭撤去及び整地工事
- ②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事
 - 敷地東側の補強土壁工事及び盛土工事
- ③諏訪湖周クリーンセンター建設工事
 - 関係諸官庁に工事計画届出書の提出及び
詳細設計協議



杭撤去工事
(イメージ)

■敷地全体状況

5月中旬時点



6月中旬時点



発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会
三井住友・興和工業特定建設工事共同企業体 連絡先:24-2110
株式会社岡谷組 連絡先:23-7285
タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体 連絡先:23-5671(岡谷組)
株式会社三水コンサルタント 連絡先:03-3980-4132
パンフィックコンサルタンツ 長野事務所 連絡先:026-228-8118
湖周行政事務組合 連絡先:23-4811(内線1443・1444)
