

諏訪湖周クリーンセンター建設

工事進捗率
98%

ecoポッポ通信



■本格稼働に向けて、2市1町(岡谷市・諏訪市・下諏訪町)のごみ受け入れを行ない、5ヶ月間に及び試運転開始！！～7月1日からごみの搬入が始まります～

センター内全機器の調整及び運転準備が完了しました。また、消防法や建築基準法に基づく建物の完了検査にも合格し、いよいよ試運転開始です。

ごみピット消火設備の放水試験



ノズルが回転し、ごみピット全域に放水可能です。

1分間に500リットルの水を放水可能です。

ごみピットには炎感知器連動の自動消火設備を設置しており、万一のごみピット火災に備えます。

ごみクレーン調整



1号・2号両方のクレーンを稼働させ、調整を行っています。

バケットをごみピットの底まで降ろし、確実にごみをつかむ設定を行いました。



諸官庁の検査

建物や機器が安全に使用できることを確認するため、諸官庁の検査を受検し、合格しました。



諏訪広域消防本部
(消火設備他)



確認審査機関(ERI)
(建物)




労働基準監督署
(圧力容器)

■今後の試運転の流れ

ecoポッポでは、7月1日からパッカー車によるごみの搬入を開始し、1週間ほど貯留した後の7月9日から実際にごみを焼却する試運転を開始します。

ごみの質は収集する地域、季節、時間等により、絶えず変動します。ごみの安定処理及び効率的な運転を行うため、11月30日の竣工までの間、実際に湖周地区のごみを焼却しながら燃焼調整や排ガス処理調整を行います。

また、不測の事態が発生したときにも施設を安定して停止又は起動できるように、必要な訓練や模擬試験を行います。

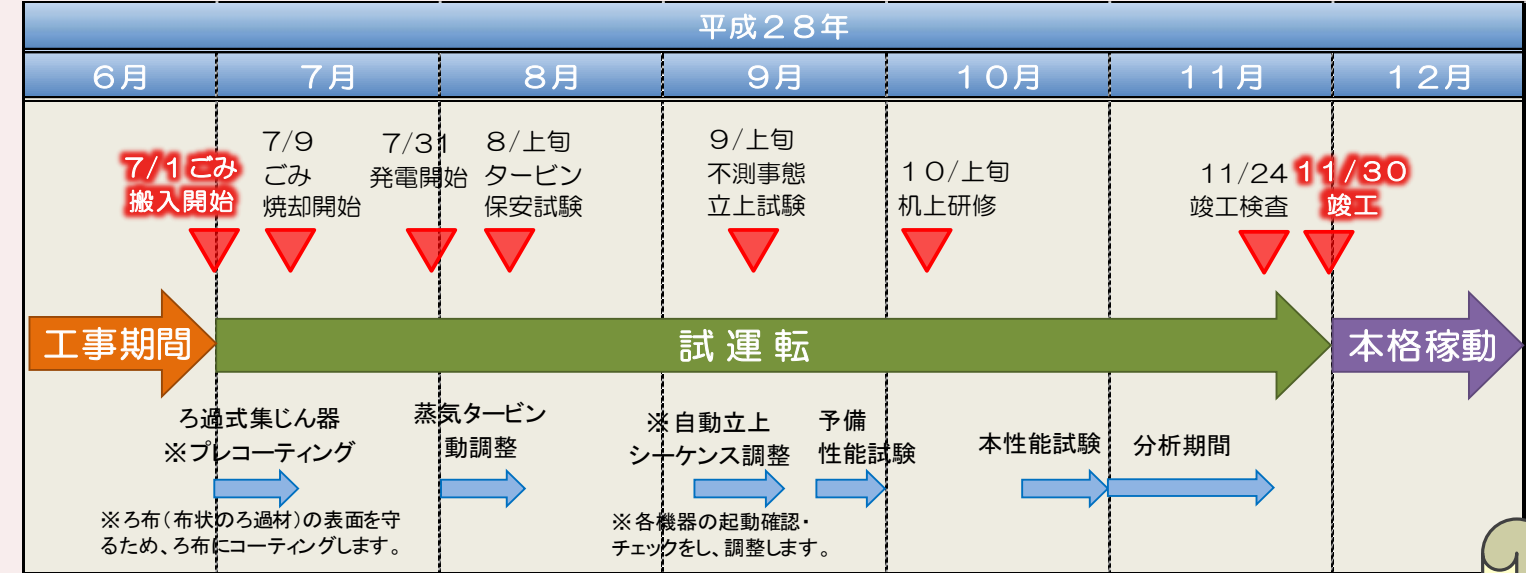

◎ 重要なお知らせ

7月からのごみ搬入は、試運転期間中のため、住民の方の直接ごみ持ち込みは受け付けておりません。

※直接持ち込みは、本格稼働の12月1日からとなります。

持ち込みごみがある場合は、これまで通り仮設ごみ預かり所(岡谷市住民)、諏訪市清掃センター(諏訪市住民)、下諏訪町清掃センター(下諏訪町住民)へお持ちください。

ご不便をお掛けしますが、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。



■組合長検査

7月1日の試運転開始に先立ち、6月17日に今井竜五組合長の現場検査を行いました。

ごみ搬入に備え、きめ細かくセンター内の点検・確認・チェックを行いました。




■ごみ搬入式を行いました。

6月29日に、岡谷市、諏訪市、下諏訪町のごみを受け入れるごみ搬入式を行いました。詳細はecoポッポ通信8月号で紹介いたします。

■工事進捗状況

工区	内容
A工区(プラント工事)	試運転調整、電気工事、配管工事、保温工事
A工区(建築工事)	内部仕上工事、設備・電気工事
B工区(プラント工事)	試運転調整、電気工事、配管工事
B工区(建築工事)	内部仕上工事、設備・電気工事
C工区	内部仕上工事、設備・電気工事

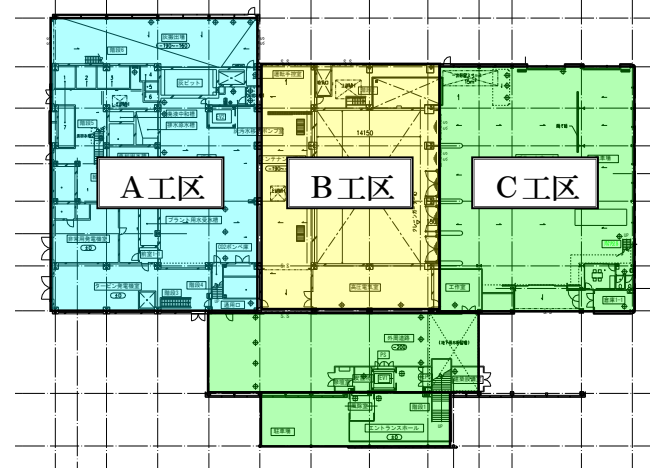

工区位置図



気象データを測定し、運転に役立てます。

温湿度観測装置 設置状況



工場の各種運転データを表示します。

環境測定表示板 据付状況



構内道路が完成しました。

舗装工事 施工状況



エントランス周りの植え込みです。

植栽工事施工状況



プラントホーム周りの機器を調整しました。

ダンピングボックス 調整状況

■今後の予定

●●●7月の試運転予定●●●

- 7月 1日 ごみ搬入開始
- 7月 8日 火入式 ごみ焼却開始
- 7月31日 発電開始

- ・各所機器 負荷運転調整
- ・各所電気計装設備 調整
- ・ろ過式集塵機 プレコーティング
- ・ごみ・灰クレーン 試運転調整
- ・主蒸気配管 洗浄
- ・蒸気タービン 連続運転開始



試運転調整(イメージ)




■敷地全体状況

5月下旬時点



6月下旬時点



発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関する工事等連絡協議会
 タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体
 株式会社タクマ株式会社 連絡先: 78-7143  株式会社岡谷組 連絡先: 75-2679
 湖周行政事務組合(岡谷市役所内) 連絡先: 23-4811(内線1443・1444)
