



諏訪湖周クリーンセンター建設

eco ポツポ通信

■地下部のコンクリート打設開始！！

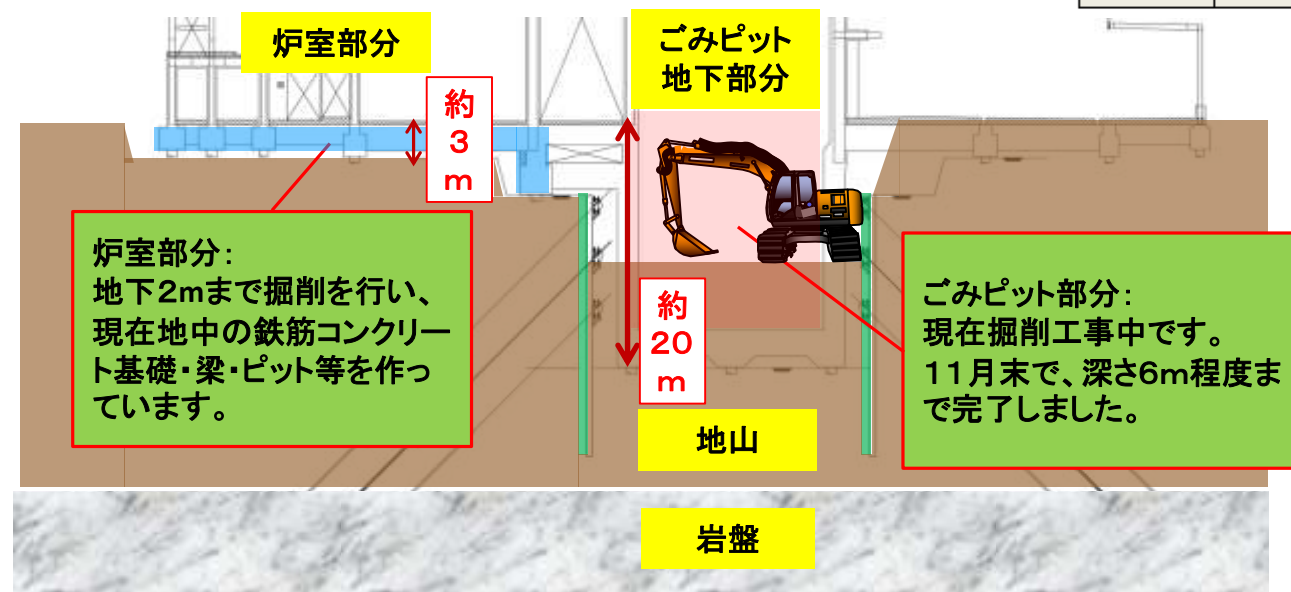
10月で基礎杭工事を終え、11月からは建物の地面より低い地下部分について、掘削工事および基礎躯体工事を始めています。

掘削工事は年内いっぱい続く予定で、焼却炉の基礎となる部分(炉室)で地下3m程度まで、ごみピットとなるもっとも深いところでは地下20m程度まで掘削する計画です。

基礎躯体工事とは、施設の地上部分を支えるために、地面より低い部分に鉄筋コンクリート製の梁等を作っていく作業で、今後は、これらの地下部躯体やごみピット、建物の躯体等で約11,000m³のコンクリート打設を行います。

タービン発電機室の
コンクリート打設状況

断面図

■循環型社会形成推進交付金の
予算確保に係る要望活動

循環型社会の形成を推進するため、市町村等は計画的に一般廃棄物処理施設の整備を行っておりますが、施設整備は長期間にわたる困難な地元調整を経て住民合意に至るものであり、国による適時適切な財政支援を必要としています。

平成26年度は、前年度補正予算による前倒し等の措置により必要額が確保されたものの、平成25年度当初の本交付金における一般廃棄物処理施設に係る内示額は、要望額の64%でありました。今後もこのような事態になれば、市町村等が計画的な事業執行ができず結果として一般廃棄物処理が滞り、国民生活に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため11月10日に、本組合をはじめ、県内の市町村や広域連合など14団体が環境省に対し計画的な事業執行が行えるよう本交付金の十分な予算の確保を要望しました。

《要望先：環境省、後藤茂之衆議院議員外地元選出国會議員》

●～地域貢献、周辺・環境にやさしい施工をめざして～

タクマ・岡谷組JVでは、地域への社会貢献や環境活動に積極的に取り組んでいます。湖周地区の各種イベントへの参加・協力、週1度の現場周辺の清掃などの活動を行っています。



愛子ちゃん募金に参加し、84,000円の募金を行いました。



諏訪湖周一斉清掃に参加しました。



毎週金曜日に、現場周辺の清掃活動を行っています。

●～今年1年を振り返って～

諏訪湖周クリーンセンター整備工事は、旧岡谷市清掃工場の解体工事が8月に完了し、その後、安全祈願祭及び起工式を執り行い9月から工事に着手しました。10月中旬までに建物の土台となる基礎杭設置が終了し、ごみピットなど地下部分の掘削工事を行いました。また、その掘削土を利用して敷地南東側の盛土工事を進めてきました。

造成工事の工事進捗率は、およそ85パーセントで、年明けには工事が完了する見込みであります。建設工事では、引き続き、掘削工事と基礎躯体工事を行い、年内中に炉室の地下躯体部分の埋戻しまで完了する見込みであります。今後も、周辺環境に配慮し、安全第一に工事を進めていきます。



安全祈願祭

杭設置工事

基礎躯体工事

掘削工事

■工事進捗状況

①諏訪湖周クリーンセンター整備工事

- 11月15日に最初のコンクリートを打設しました。
- ごみピット部分の掘削工事・基礎躯体工事を進めています。



アースアンカー打設状況



掘削工事状況



杭頭補強筋 溶接状況



コンクリート打設前検査 実施状況

②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事

- 盛土工事
敷地東側の補強土壁工事、盛土工事・法面整形を行いました。



補強土壁施工状況



盛土(法面整形)状況

■今後の予定

●●●12月の工事予定●●●

①諏訪湖周クリーンセンター整備工事

- 炉室部分は基礎躯体工事
- ごみピット部分は掘削工事、基礎躯体工事

②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事

- 敷地東側法面の排水工事を行います。
- 敷地整地工事



基礎躯体工事

■敷地全体状況

10月下旬時点



11月下旬時点



発行元	諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会
	タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体 連絡先: 78-7143
	株式会社岡谷組 連絡先: 23-7285
	湖周行政事務組合 連絡先: 23-4811(内線1443・1444)
