



## ■工事進捗状況

### ①岡谷市清掃工場解体工事

- 基礎杭撤去後、埋戻し・整地作業を行い、解体工事がすべて完了しました。



### ②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事

- 盛土工  
敷地北側の掘削・整地作業を行い、発生土を改良し、盛土を行いました。
- のり面工  
敷地内のり面に植生シートを設置しました。



改良材混合状況



植生シート設置



現場事務所設置

### ③諏訪湖周クリーンセンター建設工事

- クリーンセンター建設工事の本格着工に向けて、現場事務所の準備を行いました。

## ■今後の予定

### ●●●9月の工事予定●●●

#### ①諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事

- 敷地東側の補強土壁の施工を行います。

#### ②諏訪湖周クリーンセンター建設工事

- 工場棟機械室、およびごみピット部の杭工事、山留工事を行います。

## ★協議会からのお知らせ

### ●工事車両の通行について

工事車両は国道20号線側から工事現場へ入出場します。スピードダウンや交通法規の遵守、周辺道路での待機、違法駐車を行わないよう指導します。

現場出入口に誘導員を配置し、工事車両や一般車両、歩行者が円滑に通行できるよう誘導します。



工事車両通行ルート

### ●環境保全計画について

#### 1.騒音・振動の防止

敷地境界に騒音計・振動計を設置し、常時騒音・振動の値を監視します。




測定状況

自主管理基準の設定

項目	自主管理基準	法令基準値
騒音	80 dB (A)	85 dB (A)
振動	70 dB (A)	75 dB (A)

#### 2.濁水対策

掘削中の排水は、濁水処理設備で泥や砂を除去してから排水します。

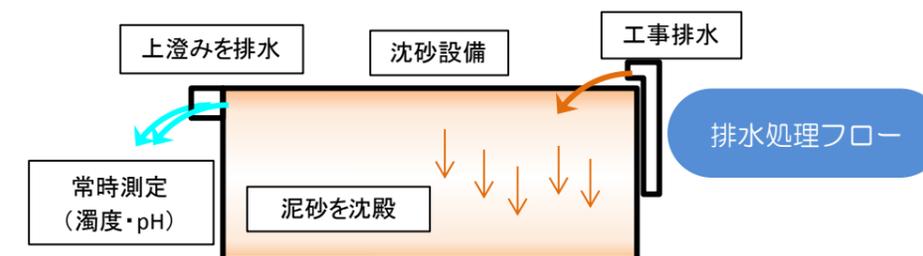

#### 3.粉じん対策

車のタイヤによる道路への泥の持ち出しが無いよう、洗浄を行います。工事用出入口付近に土砂の持ち出しがあった場合は、速やかに洗浄します。



ダンプトラックのタイヤ清掃



#### 4.周辺美化と規律の向上

関係者全員で、毎週現場及び周辺の清掃を行います。定期的な教育で、ポイ捨て等の迷惑行為の禁止、安全運転等を指導します。

発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会  
 三井住友・興和工業特定建設工事共同企業体 連絡先:24-2110  
 株式会社岡谷組 連絡先:23-7285  
 タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体 連絡先:23-5671(岡谷組)  
 株式会社三水コンサルタント 連絡先:03-3980-4132  
 パシフィックコンサルタンツ 長野事務所 連絡先:026-228-8118  
 湖周行政事務組合 連絡先:23-4811(内線1443・1444)
